

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Артеменков Михаил Николаевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 07.10.2026 22:16:29  
Уникальный программный ключ:  
a63b74166e8f4fc17bd1e0462725f79e393bdfd9

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Смоленский государственный университет»

Кафедра менеджмента

**«Утверждаю»**

Проректор по учебно-методической работе  
\_\_\_\_\_ Устименко Ю.А.  
«7» сентября 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины  
Б1.О.05 Основы проектного менеджмента**

Направление подготовки: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
Специализация: Судебная деятельность

Форма обучения: очная

Курс –1

Семестр – 1

Всего зачетных единиц – 3, часов – 108

Форма отчетности: зачёт – 1 семестр

Программу разработал

кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко

Одобрена на заседании кафедры менеджмента

14.06.2022 г., протокол № 14

Смоленск  
2022

## 1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы проектного менеджмента» (Б1.О.05) входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная часть, по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.

Изучается студентами 1 курса в 1 семестре и опирается на знания, полученные при обучении в школе.

Изучение данной дисциплины способствует формированию представлений студентов о проектной деятельности, основных этапах управления проектом, особенностями подготовки и реализации проектов.

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов как «Теория государства и права», «Экономика», «Прокурорский надзор за исполнением законодательства РФ».

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

| Компетенция                                                                                                                         | Индикаторы достижения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>УК-2.</b> Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла                                                        | <b>Знать:</b> принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе с учетом законов и методов представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; законы, формы и приемы интеллектуальной (мыслительной) познавательной деятельности.<br><b>Уметь:</b> формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта, обеспечивать работу команды необходимыми ресурсами; представлять публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научных конференциях и иных мероприятиях, применять законы формы и приемы интеллектуальной (мыслительной) познавательной деятельности.<br><b>Владеть:</b> навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла, формой и приемами интеллектуальной (мыслительной) познавательной деятельности. |
| <b>УК-3.</b> Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | <b>Знать:</b> правила командной работы; необходимые условия для эффективной командной работы; основ проектного менеджмента;<br><b>Уметь:</b> планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; организовывать обсуждение разных идей и мнений; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; анализировать условия совместной деятельности;<br><b>Владеть:</b> навыками осуществления деятельности по организации и руководству работой команды для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | достижения поставленной цели; навыками анализировать условия совместной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>УК-6.</b> Способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни | <p><b>Знать:</b> теоретико-методологические основы проектного менеджмента; направления и источники приоритетов собственной деятельности, самооценки и образования; способы самооценки собственной деятельности и ее совершенствования.</p> <p><b>Уметь:</b> определять личностные и профессиональные приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, планировать, контролировать, оценивать собственную деятельность в решении задач саморазвития и самореализации на основе проектного менеджмента;</p> <p><b>Владеть:</b> навыками осуществления деятельности по самоорганизации и образованию в соответствии с личностными и профессиональными приоритетами на основе проектного менеджмента.</p> |

### 3. Содержание дисциплины

#### Тема 1. Введение в проектный менеджмент. Система управления проектной деятельностью

Исторический аспект проектного менеджмента. Понятие и сущность проектов. Аспекты проекта: сроки, бюджет и качество результата. Ключевые понятия проектного управления: проектная и операционная деятельность; проект; мероприятие проекта; программа проектов; портфель проектов и программ. Различия между управлением рутинной и проектной деятельностью, процессом и проектом. Жизненный цикл проекта. Функции управления проектом. Типы проектов.

#### Тема 2. Планирование проекта

Инициация проекта. Анализ внешней и внутренней среды проекта. Целеполагание в проектной деятельности. Целевая аудитория проекта. Стейкхолдеры проекта. Качественные критерии выбора проекта. Количественные критерии выбора проекта. Определение плана проекта. Начало планирования: перечень действий и их взаимосвязь. Сетевое планирование: составление сетевого графа проекта, выявление критического пути и резервов времени выполнения отдельных работ проекта. Календарное планирование проектов (диаграмма Ганта). Планирование ресурсов в проекте. Спецификация проекта.

#### Тема 3. Управление проектными командами

Что представляет собой команда. Принципы организации команды: целеустремленность, сплоченность, ответственность. Количественный и ролевой состав команды. Качества командного игрока. Создание команды. Специфика проектных команд. Навыки руководителя проекта. Эффективная коммуникация с подчиненными. Навыки эффективного решения конфликтов между членами проектной команды. Эффективная мотивация подчиненных.

Различие между проектными и организационными структурами. Должностные инструкции. Матрица ответственности.

#### Тема 4. Управление бюджетом проекта

Источники и организация финансирования проектов. Смета и бюджет, финансовый план проекта. Бюджет как инструмент управления проектом. Виды затрат на реализацию проекта. Поэтапная оценка бюджета проекта в процессе его подготовки. Исходные данные для оценки проекта. Методы оценки «сверху вниз» и «снизу вверх». Расходы по капитальным и текущим операциям.

### **Тема 5. Управление рисками проекта**

Понятие риска проекта. Процессы управления рисками проекта. Методы качественного анализа рисков проекта. Методы количественного анализа рисков проекта. План реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков.

### **Тема 6. Учет и контроль хода реализации проекта**

Сущность и роль учета и контроля проекта. Методы учёта и контроля проекта. Выработка корректирующих воздействий. Тайм-менеджмент проекта. Контроль за внесением изменений в проект.

### **Тема 7. Завершение проекта и оценка эффективности проекта**

Функция руководителя проекта на завершающем этапе. Процесс завершения проекта. Роспуск команды, работавшей над проектом. Закрытие банка данных проекта. Завершение работ. Завершающая проверка и подведение итогов проекта. Сохранение материалов, имеющих отношение к проекту. Основные принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для расчета эффективности проектов. Основные показатели эффективности проекта. Оценка эффективности проекта. Постпроектная оценка.

## **4. Тематический план**

| №<br>п/п     | Разделы и<br>темы                                                           | Всего<br>часов | Формы занятий |                         |                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|              |                                                                             |                | лекции        | практические<br>занятия | Самостоятель-<br>ная работа |
| 1            | Введение в проектный менеджмент. Система управления проектной деятельностью | 12             | 2             | 4                       | 6                           |
| 2            | Планирование проекта                                                        | 30             | 2             | 14                      | 14                          |
| 3            | Управление проектными командами                                             | 14             | 2             | 6                       | 6                           |
| 4            | Управление бюджетом проекта                                                 | 11             | 1             | 2                       | 8                           |
| 5            | Управление рисками проекта                                                  | 13             | 1             | 4                       | 8                           |
| 6            | Учет и контроль хода реализации проекта                                     | 14             | -             | 4                       | 10                          |
| 7            | Завершение проекта и оценка эффективности проекта                           | 14             | -             | 6                       | 8                           |
| <b>ИТОГО</b> |                                                                             | <b>108</b>     | <b>8</b>      | <b>40</b>               | <b>60</b>                   |

## **5. Виды образовательной деятельности**

### **Занятия лекционного типа**

#### **Тема 1. Введение в проектный менеджмент. Система управления проектной деятельностью**

##### **Лекция 1. Понятие, сущность и типы проектов. Жизненный цикл проекта (2 часа)**

###### *План*

1. Исторический аспект проектного менеджмента.
2. Ключевые понятия проектного управления. Аспекты проекта: сроки, бюджет и качество результата.
3. Жизненный цикл проекта.
4. Типы проектов.

**Тема 2. Планирование проекта**  
**Лекция 2. Основы планирования проекта (2 часа)**

*План*

1. Анализ среды проекта.
2. Целевая аудитория проекта.
3. Целеполагание в проекте: SMART-технология постановки целей и построение дерева решений проекта.
4. Определение плана проекта. Начало планирования: перечень действий и их взаимосвязь. Структура работ проекта.
5. Сетевое планирование.
6. Календарное планирование проектов (диаграмма Ганта).

**Тема 3. Управление проектными командами**  
**Лекция 3. Команда проекта: создание и управление (2 часа)**

*План*

1. Что представляет собой команда.
2. Принципы организации команды: целеустремленность, сплоченность, ответственность.
3. Специфика проектных команд. Создание команды.
4. Количественный и ролевой состав команды.
5. Качества командного игрока.
6. Навыки руководителя проекта.

**Тема 4. Управление бюджетом проекта**

**Тема 5. Управление рисками проекта**

**Лекция 4. Бюджет как инструмент управления проектом (2 часа)**

*План*

1. Источники и организация финансирования проектов.
2. Смета и бюджет, финансовый план проекта.
3. Виды затрат на реализацию проекта.
4. Понятие риска проекта.
5. Методы анализа рисков.
6. Мониторинг и контроль рисков.

**Занятия семинарского типа**  
**(практические занятия)**

**Тема 1. Введение в проектный менеджмент**  
**Практическое занятие 1. Основы проектной деятельности (2 часа)**

*Вопросы для устного обсуждения*

1. Понятие и сущность проектов.
2. Аспекты проекта: сроки, бюджет и качество результата.
3. Различия между управлением рутинной и проектной деятельностью, процессом и проектом.
4. Понятие и структура проектной деятельности.

*Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1. Заполните таблицу «Типы проектов».*

| № п.п. | Типы проектов | Характеристика | Примеры |
|--------|---------------|----------------|---------|
|        |               |                |         |

## **Практическое занятие 2. Функции управления проектами и ЖЦП.**

### **Стандартизация проектной деятельности (2 часа)**

*Вопросы для устного обсуждения*

1. Функции управления проектом.
2. Жизненный цикл проекта (примеры).
3. Стандарты в проектном менеджменте.

*Обсуждение основных положений стандартов ГОСТ Р в сфере управления проектами.*

## **Тема 2. Планирование проекта**

### **Практическое занятие 3-4. Инициация и анализ среды проекта (4 часа)**

*Вопросы для устного обсуждения*

1. Процесс инициации проекта.
2. Анализ внешней среды проекта.
3. Анализ внутренней среды проекта.
4. Определение проблемы проекта и построение дерева проблем.

*Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1. Определите и сформулируйте **проблему и тему** проекта, постройте дерево проблем проекта.*

*Практическое задание 2. Проведите **PEST-анализ** внешней среды проекта.*

*Практическое задание 3. Проведите **SWOT-анализ** среды проекта.*

### **Практическое занятие 5-6. Целеполагание в управление проектом (4 часа)**

*Вопросы для устного обсуждения*

1. Целевая аудитория проекта.
2. Целеполагание в проектной деятельности (SMART-технология, построение дерева целей).
3. Определение ключевых стейкхолдеров проекта.
4. Качественные критерии выбора проекта.
5. Количественные критерии выбора проекта.

*Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1. Определите **целевую аудиторию** проекта. Используя инструмент «Персона» опишите портрет потребителя.*

*Практическое задание 2. Сформулируйте **ценностное предложение** проекта через задачи, боли и выгоды потребителя.*

*Практическое задание 3. Сформулируйте **цель** проекта по технологии **SMART**.*

*Практическое задание 4. Постройте **дерево целей** проекта.*

### **Практическое занятие 7-8. Построение плана проекта (4 часа)**

*Вопросы для устного обсуждения*

1. Определение плана проекта: планирование содержания.
2. Разработка расписания проекта, структура работ и организационный план проекта.
3. Сетевой план-график проекта, контрольные вехи, календарный план проекта.
4. Планирование персонала, планирование закупок, планирование бюджета проекта.
5. Планирование обмена информацией, планирование управления изменениями.

*Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1. Разработать иерархическую **структуру работ** проекта. Определить контрольные **вехи** проекта.*

*Практическое задание 2. Спланируйте ресурсы проекта в соответствии с таблицей:*

*Ресурсы проекта*

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ                | 1.<br>2. ... |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ          | 1.<br>2. ... |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | 1.<br>2.     |
| ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ              | 1.<br>2. ... |

**Практическое занятие 9. Разработка паспорта проекта (2 часа)**

*Вопросы для устного обсуждения*

1. Ключевые стейкхолдеры проекта.
2. Паспорт проекта.

*Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1. Заполните таблицу «Реестр стейкхолдеров проекта»*

*Реестр стейкхолдеров проекта*

| № п/п | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ И ИНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНТЕРЕСОВ (ФИО, должность, место работы) | ОЖИДАНИЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                   |                                                        |                                |
|       |                                                   |                                                        |                                |

*Практическое задание 2. Разработайте и оформите паспорт проекта вашей рабочей группы из 3-4 человек в соответствии с типовой структурой проекта, представленной ниже.*

**ПАСПОРТ Проекта**

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Наименование проекта                | <Указать наименование проекта>                                          |
| Директор проекта                    | <Указать Ф.И.О. директора проекта>                                      |
| Руководитель проекта/ блока проекта | <Указать Ф.И.О. руководителя проекта>                                   |
| Участники проекта                   | <Указать наименование подразделений и участников, вовлеченных в проект> |

**ОПИСАНИЕ Проекта**

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основания для инициации проекта | <Указать основания для инициации проекта, например, соответствие приоритетам Органа исполнительной власти>   |
| Цель (цели) проекта             | <Указать цель (цели) проекта>                                                                                |
| Задачи проекта                  | <Указать задачи проекта>                                                                                     |
| Результат (результаты) проекта  | <Указать планируемый результат (результаты) проекта, который будет достигнут посредством реализации проекта> |
| Критерии успеха проекта         | <Указать измеримый критерий (критерии) успешного завершения проекта>                                         |
| Период реализации проекта       | <Указать дату начала и окончания реализации>                                                                 |

|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | проекта, выделив этапы (при необходимости)>                                                                                                                              |
| Риски реализации проекта        | <Указать факторы, ограничивающие исполнение проекта (ресурсные ограничения, ограничения, связанные с законодательством и проч.), а также идентифицировать риски проекта> |
| Взаимосвязь с другими проектами | <Указать взаимозависимые проекты>                                                                                                                                        |

### Тема 3. Управление проектными командами

#### Практическое занятие 10-11. Команда проекта: создание и управление (4 часа)

*Вопросы для устного обсуждения*

1. Проектные команды и принципы их организации.
2. Количественный и ролевой состав команды.
3. Качества командного игрока.
4. Создание команды, специфика проектных команд.
5. Требования, предъявляемые к руководителю проекта. Навыки руководителя проекта.
6. Эффективная коммуникация с подчиненными.
7. Навыки эффективного решения конфликтов между членами проектной команды.
8. Эффективная мотивация подчиненных.

*Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1. Заполните таблицу.*

*Стадии развития команды проекта*

| Стадия развития                  | Характерные черты |
|----------------------------------|-------------------|
| 1.Формирование (forming)         |                   |
| 2. Бурление (storming)           |                   |
| 3. Нормирование (norming)        |                   |
| 4. Функционирование (performing) |                   |
| 5. Закрытие (finishing)          |                   |

*Практическое задание 2. Тест Белбина*

*Практическое задание 3. Проведите анализ ролевого распределения в команде на основе методики М. Белбина. Проанализируйте возможность комбинаций эффективных команд из членов учебной группы.*

*Тренинг командообразования*

#### Практическое занятие 12. Разработка должностных инструкций и распределение ответственности (2 часа)

*Вопросы для устного обсуждения*

1. Спецификация проекта.
2. Должностные инструкции.
3. Матрица ответственности проекта.

*Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1. Для каждого члена вашей команды выберите роли в проекте (должности). Разработайте и оформите должностные инструкции.*

*Практическое задание 2. Построение матрицы ответственности проекта*  
После проектирования организационной структуры проекта строят матрицу ответственности. Постройте **матрицу ответственности** своего проекта.

#### Тема 4. Управление бюджетом проекта

##### Практическое занятие 13. Разработка финансового плана проекта (2 часа)

*Вопросы для устного обсуждения*

1. Источники и организация финансирования проектов.
2. Смета и бюджет, финансовый план проекта.
3. Бюджет как инструмент управления проектом.
4. Виды затрат на реализацию проекта.
5. Поэтапная оценка бюджета проекта в процессе его подготовки.
6. Исходные данные для оценки проекта.
7. Методы оценки «сверху вниз» и «снизу вверх».
8. Расходы по капитальным и текущим операциям

*Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1.* Разработайте **смету проекта** в соответствии с предложенными мероприятиями.

*Практическое задание 2.* Определите и дайте сравнительную оценку альтернативным **источникам финансирования** разрабатываемого проекта (собственные, заемные и привлеченные). Ответ представьте в виде таблицы.

*Источники финансирования проекта*

| <i>Критерии</i>         | <i>Источники финансирования</i> |                |                     |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
|                         | <i>Собственные</i>              | <i>Заемные</i> | <i>Привлеченные</i> |
| Возможность получения   |                                 |                |                     |
| Стоимость использования |                                 |                |                     |
| Риски                   |                                 |                |                     |
| .....                   |                                 |                |                     |

#### Тема 5. Управление рисками проекта

##### Практическое занятие 14-15. Управление рисками проекта (4 часа)

*Вопросы для устного обсуждения*

1. Понятие риска проекта.
2. Процессы управления рисками проекта.
3. Методы качественного анализа рисков проекта.
4. Методы количественного анализа рисков проекта.
5. План реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков.

*Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1.* Перечислите ключевые риски проекта и предложите меры, по их снижению. Результат оформите в таблице.

| РИСК | МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА |
|------|------------------------|
|      |                        |
|      |                        |

#### Тема 6. Учет и контроль хода реализации проекта

##### Практическое занятие 16-17. Сущность контроля реализации проекта (4 часа)

*Вопросы для устного обсуждения*

1. Сущность и роль учета и контроля проекта.

2. Методы учёта и контроля проекта.
3. Выработка корректирующих воздействий.
4. Тайм-менеджмент проекта.
5. Контроль за внесением изменений в проект.

#### *Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1.* Предоставить мини-отчёты о выполненных работах проекта в соответствии с намеченными **контрольными вехами** проекта.

*Практическое задание 2. Решение задачи*

Нам необходимо выполнить задание проекта за несколько этапов. Эти этапы растянуты во времени (в течение 15 месяцев) и зависят от множества факторов (сезонность, цены на бензин, стоимость услуг фирм-перевозчиков и т.д.). Общая сумма затрат на реализацию проекта составляет 80 тыс руб.

Однако по истечении 12 месяцев проверка показала, что не все протекает гладко. Возникли проблемы со стоимостью (дополнительные затраты на визы, бензин и т.д.). Уже израсходовано 85 тыс руб., а работа не завершена. Работы выполнены только на 75%.

Какие же выводы мы можем сделать из создавшегося положения, и что мы можем предпринять?

#### *Решение*

Анализ прибавочной стоимости говорит нам о том, что после 12 месяцев:

Прибавочная стоимость = Объем реально выполненной работы \* Бюджетная себестоимость работы (тыс руб) =  $0,75 * 80 = 60$  тыс руб

Фактические расходы = 85 тыс руб. Плановые расходы = 80 тыс руб.

С помощью полученных трех цифр мы можем сделать следующие расчеты.

Эффективность затрат =  $((\text{Реальные результаты} / \text{запланированные результаты}) * 100\%) * (\text{Плановые издержки} / \text{реальные издержки}) = 75\% * (80 / 85) = 70,6\%$

Это означает, что на каждый фактически израсходованный рубль мы получили всего лишь 70 копеек реального результата. Следовательно, 100% выполнения работ ожидается при следующих затратах:

Ожидаемые затраты = Фактические расходы (тыс руб) / Эффективность затрат =  $85 / 0,706 = 120$  тыс руб.

Таким образом, нам необходимо затратить еще 35 тыс руб до полного окончания работ и в итоге превысить бюджет на 40 тыс руб.

### **Тема 7. Завершение проекта и оценка эффективности проекта**

#### **Практическое занятие 18. Процесс завершения проекта (2 часа)**

##### *Вопросы для устного обсуждения*

1. Функция руководителя проекта на завершающем этапе.
2. Роспуск команды, работавшей над проектом.
3. Закрытие банка данных проекта.
4. Завершение работ.
5. Сохранение материалов, имеющих отношение к проекту.

#### *Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1.* Проведите завершающую проверку и подведите итоги проведенной работы, составьте выводы по результатам разработанного проекта в соответствии с целями.

#### *Тренинг тайм-менеджмента*

Упражнение «Чувство времени»

Упражнение «Ценности и приоритеты»

Упражнение «Матрица Эйзенхауэра»

Упражнение «Поглотители времени»

Упражнение «Инструменты экономии времени»

Упражнение «Самоменеджмент» и др.

### Практическое занятие 19. Оценка эффективности проекта (2 часа)

*Вопросы для устного обсуждения*

1. Основные принципы оценки эффективности проектов.
2. Исходные данные для расчета эффективности проектов.
3. Основные показатели эффективности проекта.
4. Оценка эффективности проекта.

*Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1.* Разработайте вариант рейтингового листа «Оценка эффективности проекта», обеспечивающий дифференцированный подход к оценке результатов работы. *Пример:*

| Тема проекта |  | Критерии оценки                                                     |                                                             |                                    |                           |                                |                                          |                  |                                                |                                 |                             |                                |                                                |                 |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|              |  | Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность темы проекта | Объем разработок и количество предлагаемых решений проблемы | Реальность и практическая ценность | Уровень самостоятельности | Качество оформления материалов | Уровень разработанности продукта проекта | Качество доклада | Проявление глубины и широты знаний по проблеме | Ответы на вопросы преподавателя | Ответы на вопросы студентов | Оценка творческих способностей | Субъективная оценка деловых качеств докладчика | Итоговая оценка |
|              |  | Баллы                                                               |                                                             |                                    |                           |                                |                                          |                  |                                                |                                 |                             |                                |                                                |                 |
|              |  |                                                                     |                                                             |                                    |                           |                                |                                          |                  |                                                |                                 |                             |                                |                                                |                 |

*Практическое задание 2.* Для оценки эффективности реализации проекта должны быть разработаны **показатели эффективности** и индикаторы их оценки. Показатели эффективности могут быть как качественные, так и количественные. Оформить данный материал в виде следующей таблицы.

Ключевые показатели эффективности проекта

| ПОКАЗАТЕЛИ | ИНДИКАТОРЫ |
|------------|------------|
| ...        | ...        |
| ...        | ...        |
| ...        | ...        |

### Практическое занятие 20. Защита проектов (2 часа)

*Выполнение практических заданий*

*Практическое задание 1.* Презентация разработанных подгруппами проектов.

*Практическое задание 2.* Заполните рейтинговый лист «Оценка эффективности проекта»

*Практическое задание 3.* Ознакомление с результатами оценки эффективности проектов.

**Самостоятельная работа**

## Тема 1. Введение в проектный менеджмент. Система управления проектной деятельностью

*Практические задания для самостоятельного выполнения*

*Практическое задание 1.* На основе анализа стандарта ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» раскройте содержание основных понятий управления проектами: архив проекта, базовый план проекта, бюджет проекта, допущение, заинтересованные стороны в проекте, изменение в проекте, контрольное событие проекта, корректирующее действие, ограничение, предупреждающее действие, продукт проекта, проект, процесс, работа проекта, расписание проекта (календарный план), риск, управление проектом.

*Практическое задание 2.* На основе анализа стандарта ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» раскройте содержание основных процессов управления проектами: инициации, планирования, организации исполнения, контроля и завершения проекта. В рамках процессов управления проектом отразите действия, относящиеся к основным функциональным областям управления проектом: управление содержанием проекта; управление сроками проекта; управление затратами в проекте; управление рисками проекта; управление персоналом проекта; управление заинтересованными сторонами проекта; управление поставками проекта; управление качеством в проекте; управление обменом информацией в проекте; управление интеграцией проекта. Заполните таблицу.

*Основные процессы управления проектами*

| <i>Процесс</i> | <i>Содержание процесса</i> | <i>Действия функциональных областей</i> |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                |                            |                                         |

*Практическое задание 3.* На основе анализа стандарта ГОСТ Р 54870–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов» раскройте содержание основных процессов в управлении портфелем проектов:

- а) группа процессов обеспечения управления портфелем:
- 1) процесс сбора информации об условиях, ограничениях и требованиях к портфелю проектов;
  - 2) процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов;
- б) группа процессов формирования портфеля проектов:
- 1) процесс идентификации компонентов портфеля;
  - 2) процесс оценки компонентов портфеля;
  - 3) процесс расстановки приоритетов;
  - 4) процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов;
  - 5) процесс авторизации портфеля проектов;
- в) группа процессов мониторинга и контроля портфеля проектов:
- 1) процесс контроля реализации портфеля проектов;
  - 2) процесс управления изменениями.

## Тема 2. Планирование проекта

*Вопросы, для самостоятельного изучения:*

1. Инициация проекта.
2. Качественные критерии выбора проекта.
3. Количественные критерии выбора проекта.
4. Планирование ресурсов в проекте.

*Вопросы для подготовки устного ответа*

1. Инициация проекта.

2. Целеполагание в проектной деятельности.
3. Качественные критерии выбора проекта.
4. Количественные критерии выбора проекта.
5. Определение плана проекта.
6. Начало планирования: перечень действий и их взаимосвязь.
7. Сетевое планирование: составление сетевого графа проекта, выявление критического пути и резервов времени выполнения отдельных работ проекта.
8. Календарное планирование проектов (диаграмма Ганта).
9. Планирование ресурсов в проекте.

*Практические задания для самостоятельного выполнения*

*Практическое задание 1.* Разработайте и оформите паспорт проекта вашей рабочей группы из 3-4 человек в соответствии с типовой структурой проекта, представленной ниже.

**ПАСПОРТ Проекта**

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Наименование проекта                | <Указать наименование проекта>                                          |
| Директор проекта                    | <Указать Ф И.О. директора проекта>                                      |
| Руководитель проекта/ блока проекта | <Указать Ф.И.О. руководителя проекта>                                   |
| Участники проекта                   | <Указать наименование подразделений и участников, вовлеченных в проект> |

**ОПИСАНИЕ Проекта**


|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основания для инициации проекта | <Указать основания для инициации проекта, например, соответствие приоритетам Органа исполнительной власти>                                                               |
| Цель (цели) проекта             | <Указать цель (цели) проекта>                                                                                                                                            |
| Задачи проекта                  | <Указать задачи проекта>                                                                                                                                                 |
| Результат (результаты) проекта  | <Указать планируемый результат (результаты) проекта, который будет достигнут посредством реализации проекта>                                                             |
| Критерии успеха проекта         | <Указать измеримый критерий (критерии) успешного завершения проекта>                                                                                                     |
| Период реализации проекта       | <Указать дату начала и окончания реализации проекта, выделив этапы (при необходимости)>                                                                                  |
| Риски реализации проекта        | <Указать факторы, ограничивающие исполнение проекта (ресурсные ограничения, ограничения, связанные с законодательством и проч.), а также идентифицировать риски проекта> |
| Взаимосвязь с другими проектами | <Указать взаимозависимые проекты>                                                                                                                                        |

*Тема проекта формулируется группой самостоятельно и должна быть связана со сферой будущей профессиональной деятельности.*

*Практическое задание 2.* Постройте сетевую модель и проведите временной и ресурсный анализ.

| Работа | Предшествующая работа | Продолжительность<br>(дни) | Трудовые ресурсы (чел) |
|--------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| А      | -                     | 6                          | 2                      |
| Б      | -                     | 4                          | 3                      |
| В      | А, Б                  | 2                          | 4                      |
| Г      | Б                     | 2                          | 1                      |
| Д      | В, Г                  | 4                          | 1                      |
| Е      | В                     | 1                          | 2                      |
| Ж      | Д, Е                  | 3                          | 3                      |

*Практическое задание 3.* По данным сетевой модели определите продолжительность и резервы времени работ проекта. Что произойдет если продолжительность операции «В» увеличится на один день?

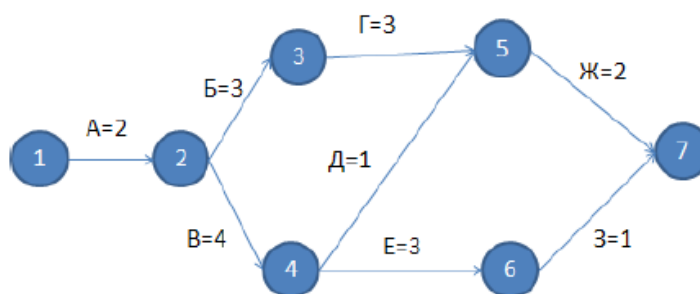


*Практическое задание 4.* Разработайте план контрольных событий проекта вашей рабочей группы. Результаты оформите в таблице.

План контрольных событий проекта  
<Указать наименование проекта>

| № п/п | Наименование задачи/контрольного события            | Ответственный исполнитель | Дата решения задачи/наступления контрольного события |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                   | 3                         | 4                                                    |
| 1     | <Указать наименование задачи проекта>               |                           | До<br>ДД.ММ.ГГ.                                      |
| 2     | <Указать наименование контрольного события проекта> |                           | ДД.ММ.ГГ.                                            |
| ...   | ...                                                 |                           |                                                      |

*Практическое задание 5.* Детализируйте План контрольных событий проекта вашей рабочей группы. Разработайте календарный план проекта (План-график проекта).

*Типовая форма Плана-графика проекта*

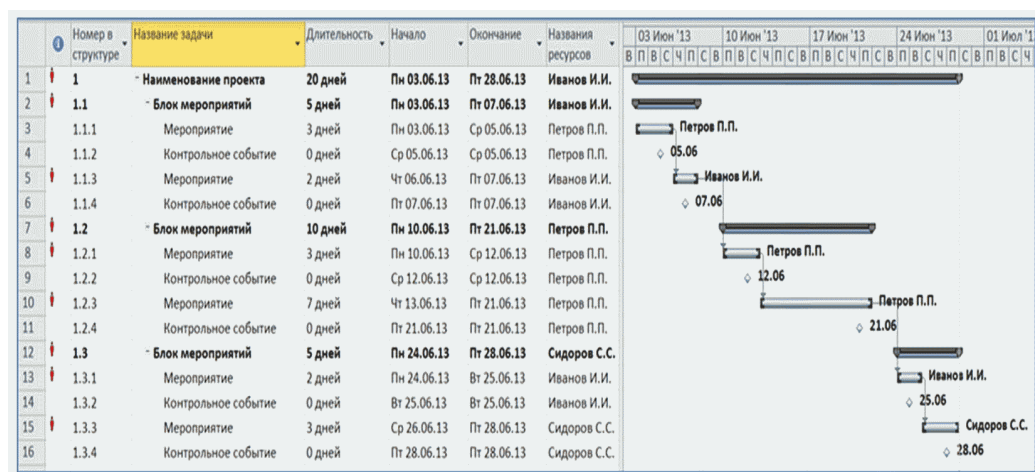

### Тема 3. Управление проектными командами

*Вопросы, для самостоятельного изучения:*

1. Эффективная коммуникация с подчиненными.
2. Навыки эффективного решения конфликтов между членами проектной команды.
3. Эффективная мотивация подчиненных.
4. Различие между проектными и организационными структурами.
5. Типы организации проектов: интегрированная структура, независимая структура и матричная структура.
6. Преимущества и недостатки этих структур, наиболее частые сферы их применения.
7. Спецификация проекта.
8. Должностные инструкции.
9. График функциональных обязанностей.

*Практические задания для самостоятельного выполнения*

*Практическое задание 1. Заполните таблицу.*

*Стадии развития команды проекта*

| Стадия развития                  | Характерные черты |
|----------------------------------|-------------------|
| 1.Формирование (forming)         |                   |
| 2. Бурление (storming)           |                   |
| 3. Нормирование (norming)        |                   |
| 4. Функционирование (performing) |                   |
| 5. Закрытие (finishing)          |                   |

*Практическое задание 2.* Проведите анализ ролевого распределения в команде на основе методики М. Белбина (пройдите тест и определите свои роли). Проанализируйте возможность комбинаций эффективных команд из членов учебной группы.

*Практическое задание 3.* Для каждого члена вашей команды выберите роли в проекте (должности). Разработайте и оформите для себя должностные инструкции.

*Практическое задание 4.* Построить матрицу ответственности проекта вашей рабочей группы. Пример:

|            | Заказчик | Руководитель проекта | Администратор | Менеджер содержания | Экономист-аналитик | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Исполнитель 3 |
|------------|----------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Действие 1 | У        | К                    |               | О                   |                    |               |               | И             |
| Действие 2 |          | У                    | О             | С                   |                    | И             |               |               |
| Действие 3 |          | У                    | С             | О                   | С                  |               |               | И             |
| Действие 4 |          |                      | К             | С                   |                    | И             | О             |               |
| Действие 5 |          |                      | К             | С                   | И                  |               | О             |               |

У – утверждает, К – координирует, С – согласовывает, О – организует, И – исполняет

#### Тема 4. Управление бюджетом проекта

*Вопросы, для самостоятельного изучения:*

1. Источники и организация финансирования проектов.
2. Смета и бюджет, финансовый план проекта.
3. Бюджет как инструмент управления проектом.
4. Виды затрат на реализацию проекта.
5. Поэтапная оценка бюджета проекта в процессе его подготовки.
6. Исходные данные для оценки проекта.
7. Методы оценки «сверху вниз» и «снизу вверх».
8. Расходы по капитальным и текущим операциям.

*Вопросы для подготовки устного ответа*

1. Источники и организация финансирования проектов.
2. Смета и бюджет, финансовый план проекта.
3. Бюджет как инструмент управления проектом.
4. Виды затрат на реализацию проекта.
5. Поэтапная оценка бюджета проекта в процессе его подготовки.
6. Исходные данные для оценки проекта.
7. Методы оценки «сверху вниз» и «снизу вверх».
8. Расходы по капитальным и текущим операциям.

*Практические задания для самостоятельного выполнения*

*Практическое задание 1.* Разработайте план мероприятий по реализации проекта в соответствии с целью и задачами и определите сроки их реализации. Оформите таблицу.

*Цель*

| Задача 1                            |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1.1. Направление (блок мероприятий) |                 |
| Мероприятие                         | Срок реализации |
| 1.1.1.                              |                 |
| 1.1.2.                              |                 |
| Задача 2                            |                 |
| 2.1. Направление (блок мероприятий) |                 |
| Мероприятие                         | Срок реализации |
| 2.1.1.                              |                 |
| 2.1.2.                              |                 |

*Практическое задание 2.* Разработайте смету проекта в соответствии с предложенными мероприятиями. Ответ представить в виде таблиц.

1. Оплата труда

### 1.1. Оплата труда административной группы

| Должность по проекту, ФИО исполнителя | Оплата труда по проекту, руб./мес. | Занятость в проекте, мес. | Имеется, руб. | Требуется, руб. | Всего, руб. |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|                                       |                                    |                           |               |                 |             |
|                                       |                                    |                           |               |                 |             |
|                                       |                                    |                           |               |                 |             |
|                                       |                                    |                           |               |                 |             |
|                                       |                                    |                           |               |                 |             |
|                                       |                                    |                           |               |                 |             |
|                                       |                                    |                           |               |                 |             |
|                                       |                                    |                           |               |                 |             |
| ИТОГО:                                |                                    |                           |               |                 |             |

### 1.2. Оплата труда привлечённых специалистов

| Должность (вид работ) | Оплата труда, руб./мес. | Кол-во человек | Занятость в проекте одного сотрудника, мес. | Имеется, руб. | Требуется, руб. | Всего, руб. |
|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|                       |                         |                |                                             |               |                 |             |
|                       |                         |                |                                             |               |                 |             |
|                       |                         |                |                                             |               |                 |             |
|                       |                         |                |                                             |               |                 |             |
|                       |                         |                |                                             |               |                 |             |
|                       |                         |                |                                             |               |                 |             |
|                       |                         |                |                                             |               |                 |             |
|                       |                         |                |                                             |               |                 |             |
| ИТОГО                 |                         |                |                                             |               |                 |             |

### 1.3. Отчисления с ФЗП

| Единый социальный налог                            | % отчислений | Имеется, руб. | Требуется, руб. | Всего, руб. |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| Отчисления с ФЗП административной группы проекта   |              |               |                 |             |
| Отчисления с ФЗП привлечённых специалистов проекта |              |               |                 |             |
|                                                    |              |               |                 |             |
| ИТОГО                                              |              |               |                 |             |
|                                                    |              |               |                 |             |
| ИТОГО на оплату труда                              |              |               |                 |             |

## 2. Прямые расходы

| Наименование статьи затрат | Стоимость, руб. | Кол-во, мес., шт. | Имеется, руб. | Требуется, руб. | Всего, руб. |
|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|
|                            |                 |                   |               |                 |             |
|                            |                 |                   |               |                 |             |
|                            |                 |                   |               |                 |             |
|                            |                 |                   |               |                 |             |
|                            |                 |                   |               |                 |             |
|                            |                 |                   |               |                 |             |
| ИТОГО                      |                 |                   |               |                 |             |
|                            |                 |                   |               |                 |             |
| ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА   |                 |                   |               |                 |             |

## Тема 5. Управление рисками проекта

*Вопросы для самостоятельного изучения*

1. Методы качественного анализа рисков проекта.
2. Методы количественного анализа рисков проекта.
3. План реагирования на риски.

*Вопросы для подготовки устного ответа*

1. Понятие риска проекта.
2. Процессы управления рисками проекта.
3. Методы качественного анализа рисков проекта.
4. Методы количественного анализа рисков проекта.
5. План реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков.

*Выполнение практических заданий*

*Практическое задание для самостоятельного выполнения.* Перечислите ключевые риски проекта и предложите меры, по их снижению. Результат оформите в таблице.

| РИСК | МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА |
|------|------------------------|
|      |                        |
|      |                        |

### **Тема 6. Учет и контроль хода реализации проекта**

*Вопросы, для самостоятельного изучения:*

1. Сущность и роль учета и контроля проекта.
2. Методы учёта и контроля проекта.
3. Выработка корректирующих воздействий.
4. Тайм-менеджмент проекта.
5. Контроль за внесением изменений в проект.

*Вопросы для подготовки устного ответа*

1. Сущность и роль учета и контроля проекта.
2. Методы учёта и контроля проекта.
3. Выработка корректирующих воздействий.
4. Тайм-менеджмент проекта.
5. Контроль за внесением изменений в проект.

*Практические задания для самостоятельного выполнения*

Предоставить мини-отчёты о выполненных работах проекта в соответствии с намеченными контрольными вехами проекта.

### **Тема 7. Завершение проекта и оценка эффективности проекта**

*Вопросы, для самостоятельного изучения:*

1. Функция руководителя проекта на завершающем этапе.
2. Процесс завершения проекта.
3. Роспуск команды, работавшей над проектом.
4. Закрытие банка данных проекта.
5. Завершение работ.
6. Завершающая проверка и подведение итогов проекта.
7. Сохранение материалов, имеющих отношение к проекту.
8. Постпроектная оценка.

*Вопросы для подготовки устного ответа*

1. Функция руководителя проекта на завершающем этапе.
2. Процесс завершения проекта.
3. Роспуск команды, работавшей над проектом.
4. Закрытие банка данных проекта.
5. Завершение работ.
6. Завершающая проверка и подведение итогов проекта.
7. Сохранение материалов, имеющих отношение к проекту.

8. Основные принципы оценки эффективности проектов.
9. Исходные данные для расчета эффективности проектов.
10. Основные показатели эффективности проекта.
11. Оценка эффективности проекта.
12. Постпроектная оценка.

*Подготовка презентации «Завершение проекта и оценка его эффективности»*

Проведите оценку эффективности проекта. Оформите все выполненные вами практические задания в форме презентации проекта вашей группы. Подготовьте командное выступление для защиты проекта.

## **6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины**

### **6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации**

Виды текущего контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины:

- 1) устный опрос;
- 2) выполнение практических заданий;
- 3) подготовка групповой презентации проекта.

#### **1. Требования к устному ответу на вопросы семинарского (практического) занятия**

Ответы студенты должны иллюстрировать конкретными примерами, опираться на нормативно-правовую базу, прослеживать связи между теоретическими и практическими положениями учебной дисциплины, применять теоретические знания к решению вопросов.

Устный ответ предполагает:

- грамотность устной речи;
- убедительность устной речи;
- ясность, точность;
- строгая последовательность, иллюстрация.

#### ***Примеры вопросов к устному опросу***

1. Эффективная коммуникация с подчиненными.
2. Навыки эффективного решения конфликтов между членами проектной команды.
3. Эффективная мотивация подчиненных.
4. Различие между проектными и организационными структурами.
5. Типы организации проектов: интегрированная структура, независимая структура и матричная структура.
6. Преимущества и недостатки этих структур, наиболее частые сферы их применения.
7. Спецификация проекта и др.

#### ***Критерии оценки устного ответа***

При оценке ответа учитывается:

- полнота и правильность ответа;
- логика изложения;
- степень осознанности и понимания изученного;
- связь теории с практикой.

|                                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Отлично» ставится, если студент: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обстоятельно и достаточно полно излагает материал;</li> <li>- обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, привести примеры;</li> </ul> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | - строит ответ последовательно.                                                                                                                                                               |
| «Хорошо» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание материала, однако:                                    | - допускает единичные ошибки, но исправляет их самостоятельно после замечаний преподавателя;<br>- не всегда может убедительно обосновать свое суждение;<br>- допускает отдельные погрешности. |
| «Удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных теоретических положений темы, но: | - излагает материал недостаточно полно;<br>- не может обосновать свои суждения и привести необходимые примеры; нарушает последовательность в изложении материала.                             |
| «Неудовлетворительно» ставится, если студент:                                                                         | - обнаружил незнание большей части темы (раздела, вопроса);<br>- при ответе на вопрос искажает его смысл;<br>- излагает материал беспорядочно и неуверенно.                                   |

**Оценка** может быть поставлена студенту как за единовременный ответ, так и за ответ, рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных в процессе занятий.

## 2. Требования к выполнению практических заданий


Практическое задание выполняется в письменном (печатном) виде. Это вид учебной работы студента по аналитической обработке информации, принятию самостоятельных решений, инициированию творческих идей, их оформлению в творческий продукт.

### *Примеры практических заданий*

*Практическое задание 1.* Постройте сетевую модель и проведите временной и ресурсный анализ.

| Работа | Предшествующая работа | Продолжительность (дни) | Трудовые ресурсы (чел) |
|--------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| А      | -                     | 6                       | 2                      |
| Б      | -                     | 4                       | 3                      |
| В      | А, Б                  | 2                       | 4                      |
| Г      | Б                     | 2                       | 1                      |
| Д      | В, Г                  | 4                       | 1                      |
| Е      | В                     | 1                       | 2                      |
| Ж      | Д, Е                  | 3                       | 3                      |

*Практическое задание 2.* По данным сетевой модели определите продолжительность и резервы времени работ проекта. Что произойдет если продолжительность операции «В» увеличится на один день?

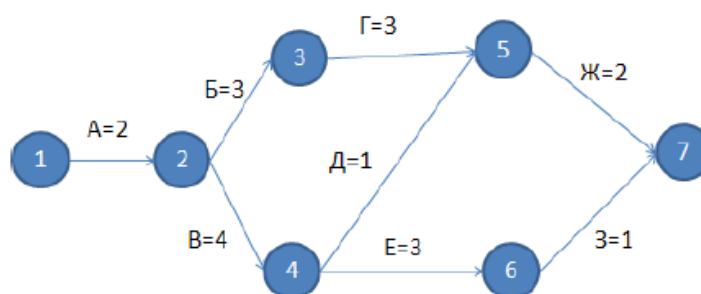

**Практическое задание 3.** Разработайте план контрольных событий проекта вашей рабочей группы. Результаты оформите в таблице.

План контрольных событий проекта  
<Указать наименование проекта>

| № п/п | Наименование задачи/контрольного события            | Ответственный исполнитель | Дата решения задачи/наступления контрольного события |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                   | 3                         | 4                                                    |
| 1     | <Указать наименование задачи проекта>               |                           | До<br>ДД.ММ.ГГ.                                      |
| 2     | <Указать наименование контрольного события проекта> |                           | ДД.ММ.ГГ.                                            |
| ...   | ...                                                 |                           |                                                      |

### **Показатели и критерии оценки задания:**

полнота выполнения задания – от 0 до 3 баллов;

правильность выполнения задания (технологически) – от 0 до 3 баллов;

точность расчётов / логичность рассуждений – от 0 до 3 баллов;

аккуратность выполнения – от 0 до 3 баллов.

Шкала оценки: 0 – требование не выполнено; 1 – требование выполнено частично; 2 – требование выполнено, но есть недочёты; 3 – требование выполнено.

«зачтено» – 9 баллов и более;

«не зачтено» – менее 9 баллов.

Для получения оценки «зачтено» по выполнению практических заданий студент должен получить оценку зачтено по каждому выполнению практического задания из п.5 данной программы.

## **3. Требования по подготовке презентации**

### **Требования к презентации «Завершение проекта и оценка его эффективности»**

Презентации готовятся в виде слайдов с использованием программы Microsoft Power Point.

1. Структура презентации должна включать титульный лист (на титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование проекта, фамилии и инициалы группы разработчиков); основную часть, содержащую отражение основных разделов паспорта проекта (включая описание стейкхолдера проекта, цель и задачи проекта,

сроки, ресурсы и т.д.), раздел планирования (временного, финансового, человеческих ресурсов + матрица ответственности), раздел оценки эффективности проекта.

2. Презентация выполняется студентами самостоятельно. Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо употреблять термины, свойственные данной дисциплине, избегать непривычных понятий и символов, сложных грамматических оборотов. Рекомендуется включать схемы и таблицы, рекламные фото и видео, если они помогают раскрыть основное содержание исследования. Приводимые в тексте цитаты должны быть точными, их необходимо давать в кавычках с обязательным указанием источника (автора, названия работы, издательства, года издания и номера страницы).

3. Объем презентации – от 12 до 20 слайдов.

4. При получении отрицательной оценки работа отдается студентам на доработку и с учетом замечаний возвращается для повторной проверки.

#### ***Критерии оценивания презентаций:***

Показатели и критерии оценки:

полнота выполнения заданий – от 0 до 3 баллов;

соблюдение требований к структуре – от 0 до 3 баллов;

соблюдение требований к изложению материала – от 0 до 3 баллов;

соблюдение требований к оформлению и объёму презентации – от 0 до 3 баллов.

Шкала оценки: 0 – требование не выполнено; 1 – требование выполнено частично; 2 – требование выполнено, но есть недочёты; 3 – требование выполнено.

«зачтено» - от 7 до 12 баллов;

«не зачтено» - 6 и менее баллов.

### **6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации**

Зачет предполагает проверку учебных достижений обучаемых по всей программе дисциплины с целью оценивания полученных теоретических знаний, навыков самостоятельной работы, умения на практике применять полученные знания. Зачет проводится в форме тестирования.

#### **Вопросы для самоконтроля при подготовке к зачёту (итоговому тестированию)**

1. Что такое «проект» и «управление проектом»?
2. Чем проект отличается от процесса?
3. Понятие и структура проектной деятельности.
4. Сравнение функций традиционного и проектного менеджмента.
5. Международные стандарты управления проектами.
6. Стандартизация проектной деятельности в РФ.
7. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента.
8. Основные направления развития проектного менеджмента.
9. Классификация типов проектов.
10. Разработка концепции проекта: формирование идеи проекта, предварительная проработка целей и задач проекта, предварительный анализ осуществимости проекта, ходатайство о намерениях, стратегии проекта.
11. Окружение проекта.
12. Жизненный цикл проекта. Содержание основных этапов.
13. Подсистемы управления проектами.
14. Методы управления проектами.
15. Основные принципы построения организационных структур проекта.
16. Командные роли в проекте. Принципы командного взаимодействия.
17. Управление командой проекта.
18. Офис проекта: понятие и принципы проектирования.

19. Источники и организация финансирования проектов.
20. Основные функции управления проектами.
21. Целеполагание в проекте: SMART-технология постановки целей проекта и построения дерева целей проекта.
22. Функция планирования проекта: содержание и методы.
23. Организация проектной деятельности.
24. Основные принципы и инструменты построения контроля проекта.
25. Тайм-менеджмент в проекте.
26. Завершение проекта.
27. Оценка эффективности проекта.
28. Взаимосвязь объёмов, продолжительности и стоимости работ. Диаграмма Ганта.
29. Управление рисками проекта в условиях неопределённости.
30. Современные стандарты качества управления проектом.

### **Примерные тестовые задания и критерии оценки теста**

#### **1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что ...**

- 1- проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием;
- 2- проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению;
- 3- процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания;
- 4- процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления.

#### **2. Окружение проекта – это ...**

- 1- среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта;
- 2- совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта;
- 3- группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей;
- 4- местоположение реализации проекта и близлежащие районы.

#### **3. На стадии разработки проекта - ...**

- 1- расходуется 9-15% ресурсов проекта;
- 2- расходуется 65-80% ресурсов проекта;
- 3- расходуется 75-90% ресурсов проекта;
- 4- ресурсы проекта не расходуются.

#### **4. Проект – это ...**

- 1- инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия;
- 2- ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией;
- 3- группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей;
- 4- совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели.

#### **5. Наибольшее влияние на проект оказывают ...**

- 1- экономические и правовые факторы;
- 2- экологические факторы и инфраструктура;

- 3- культурно-социальные факторы;  
4- политические и экономические факторы.

Ключ: 1-3; 2-1; 3-1; 4-2; 5-1.

### ***Критерии оценки теста***

Тест состоит из 18 вопросов, охватывающих все темы курса.

| Оценка     | Характеристики ответа студента |                    |
|------------|--------------------------------|--------------------|
| Зачтено    | 51-100%                        | 10-18              |
|            | правильных ответов             | правильных ответов |
| Не зачтено | 50% и менее                    | 9 и менее          |
|            | правильных ответов             |                    |

## **ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**Оценка по дисциплине выставляется по итогам зачета, при этом условием получения положительной оценки является отработка студентом не менее 75% практических занятий, оценка «зачтено» по итоговому тесту и получение студентом положительной оценки по всем видам работ, описанных в разделе 6.1 данной программы.**

### ***Оценка «зачтено» выставляется студенту:***

- 1) отработавшему 75% практических занятий;
- 2) получившему оценку «зачтено» за итоговый тест;
- 3) получившему оценку «зачтено» за групповую презентацию;
- 4) получившему оценку «зачтено» за выполнение практических заданий.

### ***Оценка «не зачтено» выставляется студенту:***

- 1) отработавшему менее 75% практических занятий
- 2) И/ИЛИ получившему оценку «не зачтено» за итоговый тест
- 3) И/ИЛИ получившему оценку «не зачтено» за групповую презентацию
- 4) И/ИЛИ получившему оценку «не зачтено» за выполнение практических заданий.

## **7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

### **7.1. Основная литература**

1. Зуб, А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489197>
2. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468486>

### **7.2. Дополнительная литература**

1. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии: учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470148>.

2. Москвин, С. Н. Управление проектами в сфере образования: учебное пособие для вузов / С. Н. Москвин. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11817-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496072>

3. Управление программными проектами: учебное пособие для вузов / В. Е. Гвоздев [и др.]; под редакцией Р. Ф. Маликова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14329-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/477333>.

4. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта: учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473824>.

5. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489513>

6. Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом: практическое пособие / В. В. Холодкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09088-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494291>

7. Борщевский, Г. А. Управление государственными программами и проектами: практическое пособие для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14821-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/481974>

### **7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. <http://bishelp.ru/> - сайт «Помощь бизнесу».
2. <https://cbrand.agency/> – специализированный интернет-портал – проект CreateBrand.
3. <http://www.marketer.ru/> – сайт, посвященный проблематике маркетинга.
4. <http://ru.wikipedia.org/> – свободная энциклопедия Википедия.
5. <http://www.consultant.ru/> – сайт СПС КонсультантПлюс.
6. <http://www.officemart.ru> – справочно-аналитический ресурс обеспечения офиса.
7. <http://window.edu.ru/> – федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».

### **8. Материально-техническое обеспечение**

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, уч. корпус №2, ауд. 518 (кабинет менеджмента и маркетинга)

Стандартная учебная мебель (24 учебных посадочных места), стол и стул для преподавателя – по 1 шт.

Кафедра для лектора – 1 шт.

Доска настенная трехэлементная – 1 шт.

Наборы учебно-наглядных пособий

Нестационарный мультимедийный комплекс: мультимедийный проектор BenQ - 1 шт.;

ноутбук Lenovo - 1 шт.; переносной настенный экран – 1 шт.

Помещение для самостоятельной работы: 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, уч. корпус №2, ауд. 520 (компьютерная лаборатория с выходом в Интернет)

Компьютерный студенческий стол – 15 шт.

Компьютерный стол для преподавателя – 1 шт.

Интерактивная доска IQBoard  
Мультимедиа проектор Optoma PX 329 DLP  
16 персональных компьютеров с выходом в Интернет  
Стандартная учебная мебель (16 учебных посадочных мест).

#### **9. Программное обеспечение**

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный АО «Лаборатория Касперского».

Microsoft Open License в составе:

- Microsoft Windows Professional XP, 7, 8, Server Russian;
- Microsoft Office 2003-2016 Russian.
